

隨意契約結果書

工 事 名	築城(7)施設最適化工事(技術協力業務対象工事(その1))		工 事 場 所	福岡県築上郡築上町	種 別	建築一式	工 期	R7.12.6 ～ R11.3.30	工 事 概 要	(建築、土木、設備分) ・仮設建物A設置、リース (鉄骨造2階建て／延べ面積 約620㎡) 外
契 約 の 相 手 方	名 称 等	大林組・若築建設・大本組・九鉄工業・松山建設・瀬口組JV					法 人 番 号			
	住 所	福岡県福岡市中央区天神一丁目14番18号								
契 約 金 額	¥ 1,025,860,000 (税込) (¥ 932,600,000 (税抜))									
予 定 価 格	¥ 1,031,550,285 (税込) (¥ 937,772,987 (税抜))									
契 約 年 月 日	令和 7 年 12 月 5 日									
選 定 理 由	会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定に基づき随意契約を行う。									

随意契約結果及び契約の内容

工 事 名	築城(7)施設最適化工事（技術協力業務対象工事（その1））
工 事 概 要	・仮設建物A設置、リース(鉄骨造2階建て／延べ面積 約620㎡) ・仮設建物B設置、リース(鉄骨造平屋建て／延べ面積 約440㎡) ・仮設建物C設置、リース(鉄骨造2階建て／延べ面積 約430㎡) ・仮設建物D設置、リース(鉄骨造平屋建て／延べ面積 約280㎡) ・国旗掲揚台 解体及び新設 一式 ・土壤汚染調査 一式
契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地	支出負担行為担当官 九州防衛局長 伊藤哲也 福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-7
契 約 年 月 日	令和7年12月5日
契 約 業 者 名	築城(6)施設最適化総合設計に係る技術協力業務対象工事 大林組・若 築建設・大本組・九鉄工業・松山建設・瀬口組 最適化事業建設共同企 業体
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市中央区天神1-14-18
契 約 金 額	1,025,860,000円（税込み）
予 定 価 格	1,031,550,285円（税込み）
随 意 契 約 に よ る こ と と し た 理 由	本案件は、当該基地において、複数の施設を集中的に実施していく大型事業であるとともに、その実施に当たっては、自衛隊の運用に支障をきたさない施工計画・仮設計画等が必要となるなど、発注者が最適な仕様を設定できない工事である。このような工事を着実に実施していくためには、仕様の前提となる条件を確定できない早期の段階から、仮設計画や施工を念頭に置いた技術的な知見・ノウハウを設計に反映することが必要である。このため、設計段階から施工者が設計に関与し、施工者の技術を設計に取り入れる技術提案・交渉方式（技術協力・施工タイプ）を採用し、技術提案を求めた。 選定に当たっては、「技術協力業務の実施に関する提案」、主たる事業課題に関する提案として「築城基地におけるコストの抑制を図りながら、着実に工事を完成させるための工法及び施工手順における課題と対応策提に関する提案」及び「築城基地において狭隘な基地内での工事計画を踏まえた仮設計画における工法、施工計画及び対応策に関する提案」並びに不測の事態の想定、対応力に関する提案として「築城基地の工事計画が変更となった場合の課題と対応策に関する提案」について技術提案を審査した結果、事業目的の達成のために総合的に最も評価の高い技術提案を行った「築城（6）施設最適化総合設計に係る技術協力業務対象工事大林組・若築建設・大本組・九鉄工業・松山建設・瀬口組最適化事業建設共同企業体」を優先交渉権者とし、当該技術を反映する業務を契約締結した。 本工事は、この技術提案に基づく工事に先立ち準備・仮設工事等を行うものであり、築城（6）施設最適化総合設計に係る技術協力業務の受注者である築城（6）施設最適化総合設計に係る技術協力業務対象工事大林組・若築建設・大本組・九鉄工業・松山建設・瀬口組最適化事業建設共同企業体が工事の実施が可能な唯一の者である。 よって、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定に基づき随意契約を行う。
工 事 場 所	福岡県築上郡築上町
工 事 種 別	建築一式工事
工 期（自）	令和7年12月6日
工 期（至）	令和11年3月30日
備 考	

築城(7)施設最適化工事（技術協力業務対象工事（その１））
に係る契約者の選定経緯

１．工事概要

(1) 発注者

九州防衛局

(2) 工事名

築城(7)施設最適化工事（技術協力業務対象工事（その１））

(3) 工事場所

福岡県築上郡築上町

(4) 工事内容


- ・仮設建物A設置、リース(鉄骨造2階建て／延べ面積 約620㎡)
- ・仮設建物B設置、リース(鉄骨造平屋建て／延べ面積 約440㎡)
- ・仮設建物C設置、リース(鉄骨造2階建て／延べ面積 約430㎡)
- ・仮設建物D設置、リース(鉄骨造平屋建て／延べ面積 約280㎡)
- ・国旗掲揚台 解体及び新設 一式
- ・土壌汚染調査

(5) 工期

契約締結日の翌日から令和１１年３月３０日まで

２．工事契約の経緯

(1) 契約者決定の流れ

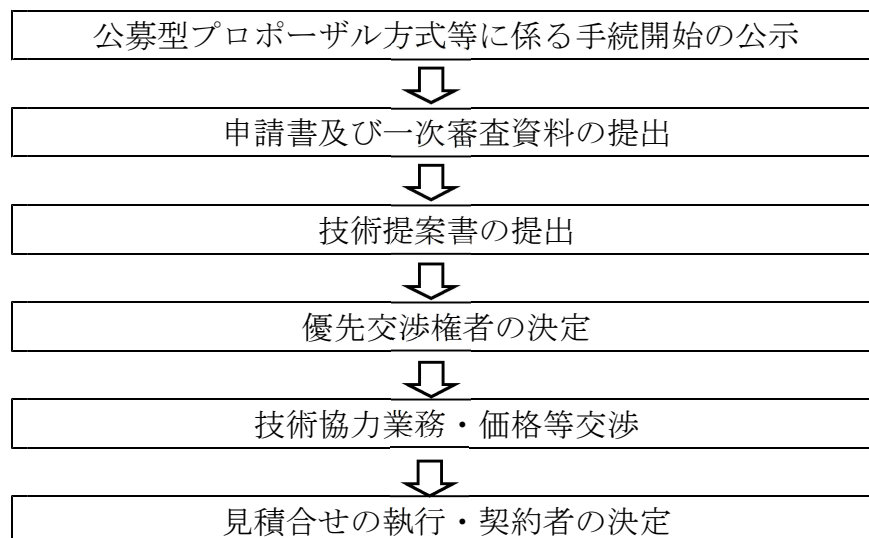

(2) 契約者決定までの主な経緯

日 付	内 容
令和 6年 1月26日～ 令和 6年 2月 8日	技術提案・交渉方式に係る有識者への意見聴取(第1回)
令和 6年 3月 1日～ 令和 6年 3月 7日	技術提案・交渉方式に係る有識者への意見聴取(第2回)
令和 6年 3月28日	競争参加資格・指名審査委員会(公示内容確認)
令和 6年 4月 1日	契約手続開始の公示
令和 6年 4月 1日～ 令和 6年 4月22日	申請書の提出期間
令和 6年 5月 9日	競争参加資格・指名審査委員会(技術提案提出要請者決定)
令和 6年 5月13日	技術提案書の提出要請
令和 6年 5月13日～ 令和 6年 6月10日	技術提案書の提出期間
令和 6年 6月14日	技術提案書提出者に対してのヒアリング
令和 6年 6月20日～ 令和 6年 6月21日	技術提案・交渉方式に係る有識者への意見聴取(第3回)
令和 6年 7月 4日	競争参加資格・指名審査委員会(優先交渉権者決定)
令和 6年 7月 5日	優先交渉権者決定
令和 6年 8月 2日	基本協定締結、技術協力業務委託契約、設計協力協定締結
令和 7年10月20日～ 令和 7年10月27日	工事における価格等交渉
令和 7年10月31日	技術提案・交渉方式に係る有識者への意見聴取(第4回)
令和 7年11月 6日	競争参加資格・指名審査委員会(契約相手方特定)
令和 7年11月14日	特定通知
令和 7年11月25日	見積合せ
令和 7年12月 5日	工事請負契約締結

(3) 工事実施者の選定方式

本事案は、当該基地において、複数の施設を集中的に実施していく大型事業であるとともに、その実施に当たっては、自衛隊の運用に支障をきたさない施工計画・仮設計画等が必要となるなど、発注者が最適な仕様を設定できない工事である。このような工事を着実に実施していくためには、仕様の前提となる条件を確定できない早期の段階から、仮設計画や施工を念頭に置いた技術的な知見・ノウハウを設計に反映することが必要である。このため、設計段階から施工者が設計に関与し、施工者の技術を設計に取り入れる技術提案・交渉方式(技術協力・施工タイプ)を採用することとした。

本方式は、技術提案に基づき選定された優先交渉権者と技術協力業務の契約を締結

し、別の契約に基づき実施している設計に技術提案内容を反映させ、目標工期、工事額を算定した上で、価格等の交渉を行い、交渉が成立した場合に施工の契約を締結するものである。

(4) 工事実施者の選定体制

技術提案等の審査・評価は、九州防衛局競争参加資格・指名審査委員会に諮ったうえで決定した。

また、審査・評価の中立性・公平性を確保を図るため、下記の学識経験者4名に、公示前、技術審査段階の2段階において意見聴取を行った。

表－1 技術提案・交渉方式に係る意見聴取を行った学識経験者

氏 名	所 属
笠間 清伸	九州大学 工学部土木工学科 防災地盤工学研究室 教授
佐川 康貴	九州大学 大学院工学研究院 社会基盤部門 准教授
玉井 宏樹	九州大学 大学院工学研究室 社会基盤部門 准教授
松嶋 敦	松嶋敦公認会計士事務所

3. 競争参加資格確認等

(1) 競争参加資格確認

競争参加資格確認は、競争参加者としての適正な資格と必要な実績を有するかを審査するものである。

(2) 審査結果

令和6年4月22日までに1者の応募があり、提出された申請書について資格審査を行った結果、競争参加資格を満たしていた。

競争参加資格を有する1者に対し令和6年5月13日付で技術提案書の提出要請を行った。

4. 技術提案審査

(1) 技術提案審査の概要

技術提案審査にあたり、以下の3提案を求めた。

①技術協力業務に関する提案

(a) 技術協力業務の実施に関する提案

②主たる事業課題に関する提案

(b) コストの抑制を図りながら、着実に工事を完成させるための工法及び施工手順における課題と対応策提に関する提案

(c) 狭隘な基地内での工事計画を踏まえた仮設計画における工法、施工計画及び対応策に関する提案

③不測の事態の想定、対応力に関する提案

(d) 工事計画が変更となった場合の課題と対応策に関する提案

提出された技術提案書について、技術提案を評価し、技術協力業務及び価格交渉を行う優先交渉権者の交渉権者を決定した。技術提案の評価は、各者60分のヒアリングを実施し技術提案内容の確認を行ったうえで、上述の提案項目に関する提案内容を審査することで行った。

(2) 審査結果

審査にあたっての評価基準及び配点は表－2、審査結果は表－3のとおりである。

表－2 評価基準及び配点

評価項目			評価基準		配点
技術 提案	技術 協力 業務 に 関 する 提 案	(a) 技術協力 業務の実 施に 関する 提案	理解度	業務目的、現地条件、与条件の内容理解度について、以下である場合に優位に評価する。 ・業務目的、現地条件、与条件に対して、適切かつ論理的に整理されており、本業務を遂行するに当たって理解度が高い場合。	10点
			実施手順 及び実施 体制	業務実施手順を示す実施フロー及び実施体制について、以下である場合に優位に評価する。 ・実施手順の妥当性及び手順上の具体的な工夫がある場合。 ・業務工程で与条件に対して、主要ポイントの抽出に対する着眼点が適切である場合。 ・本業務の内容、規模に対して十分（具体的）な実施体制が確保されている場合。	10点
		(b) コストの 抑制を 図りながら、 着実に工 事を完成 させるた めの工法	的確性	フェーズごとに複数建物の新設等の工事を同一時期に施工することとなるが、多くの資機材や作業員を確保し、コストの抑制を図りながら、着実に工事を完成させるための工法及び施工手順について、課題と対応策が以下である場合に優位に評価する。 ・周辺環境等の現場条件等を踏まえ、施工上の課題が適切かつ論理的に整理されており、その対応	30点

	主たる事業課題に関する提案	及び施工手順における課題と対応策に関する提案	策として有効な提案がある場合	
		実現性	提案内容の実現性について、以下である場合に優位に評価する。 ・提案された内容について、実施事例や類似事例（事例は国内外を問わない。）の記述があり、提案に十分（具体的）な裏付けがある等の場合 ・提案された内容について、工事を円滑かつ速やかに進めるために、コスト面を考慮した上で現場作業の省力化や資機材の安定的供給及び有能な労務等の安定的確保に関する記述があり、提案に十分（具体的）な裏付けがある場合	15点
		(c) 狭隘な基地内での工事計画を踏まえた仮設計画における工法、施工計画及び対応策に関する提案	フェーズごとに複数建物の新設等の工事を同一時期に施工することとなるが、狭隘な基地内における工事において、玉突き整備に伴う仮設建物、現場従事者への仮設建物、工事車両及び資材ヤードなどの仮設計画（敷地外の計画も可とする）について、課題と対応策が以下である場合に優位に評価する。 ・狭隘な基地内の状況等を踏まえた課題が抽出され、かつ、具体的かつ計画的に整理されており、その対応策として有効な提案がある場合	30点
			提案内容の実現性について、以下である場合に優位に評価する。 ・提案された内容について、実施事例や類似事例（事例は国内外を問わない。）の記述があり、提案に十分（具体的）な裏付けがある等の場合 ・提案された内容について、飛行場基地としての特殊性及び狭隘な基地内での工事を踏まえた内容となっており、提案に十分（具体的）な裏付けがある等の場合	15点
不測の事態の想定、	(d) 工事計画が変更となった場合の課題と対応策に関する提案	的確性	フェーズごとの工事計画（建物の施工手順等）について、工事計画が変更となった場合の課題と対応策について、以下である場合に優位に評価する。 ただし、事業期間の変更はしない前提とする。 ・着眼点、施工上の課題が適切かつ論理的に整理されており、その対応策として、確実に事業期間内に完成させるための有効な提案がある場合	20点
			提案内容の実現性について、以下である場合に	10点

対 応 力 に 関 す る 提 案		実現性	優位に評価する。 ・提案された内容について、実施事例や類似事例（事例は国内外を問わない。）の記述があり、提案に十分（具体的）な裏付けがある等の場合。	
合計				140点

表－3 審査結果

件名： 築城(6)施設最適化総合設計に係る技術協力業務

選定通知日： 令和6年7月5日

業者名	技術提案				合計点	概要
	評価項目(a)	評価項目(b)	評価項目(c)	評価項目(d)		
A社	14.66	33.00	33.00	18.00	98.66	優先交渉権者

凡例

A社：築城(6)施設最適化総合設計に係る技術協力業務対象工事 大林組・若築建設・大本組・九鉄工業・松山建設・瀬口組 最適化事業建設共同企業体

表－4 個別評価

評価項目		A社
評価項目(a)	理解度	A'
	実施手順及び実施体制	A'
評価項目(b)	的確性	A'
	実現性	B
評価項目(c)	的確性	A'
	実現性	B
評価項目(d)	的確性	B
	実現性	B

凡例

(a)

理解度

A：業務目的、現地条件、与条件について、適切かつ論理的に整理されており、本業務

を遂行するに当たって理解度が特に高い。

- A'：業務目的、現地条件、与条件について、適切かつ論理的に整理されており、本業務を遂行するに当たって理解度が高い。
- B：業務目的、現地条件、与条件について、整理されており、本業務を遂行するに当たって理解度が評価に値する。
- B'：業務目的、現地条件、与条件について、記載があるが、内容が一般的である。
- C：業務目的、現地条件、与条件について、記載があるが、内容が不明確である。
- ：業務目的、現地条件、与条件について、記載があるが、内容が不適切である。

実施手順及び実施体制

- A：実施手順及び手順上の具体的な工夫、主要ポイントの抽出に対する着眼点、実施体制の確保について、適切かつ具体的に整理されており、内容が特に優れている。
- A'：実施手順及び手順上の具体的な工夫、主要ポイントの抽出に対する着眼点、実施体制の確保について、適切かつ具体的に整理されており、内容が優れている。
- B：実施手順及び手順上の具体的な工夫、主要ポイントの抽出に対する着眼点、実施体制の確保について、整理されており、内容が評価に値する。
- B'：実施手順及び手順上の具体的な工夫、主要ポイントの抽出に対する着眼点、実施体制の確保について、記載があるが、内容が一般的である。
- C：実施手順及び手順上の具体的な工夫、主要ポイントの抽出に対する着眼点、実施体制の確保について、記載があるが、内容が不明確である。
- ：実施手順及び手順上の具体的な工夫、主要ポイントの抽出に対する着眼点、実施体制の確保について、記載がない、または、内容が不適切である。

(b)

的確性

- A：現場条件等を踏まえ提案された工法や施工手順等について、施工上及び維持管理上の課題が適切かつ論理的に整理されており、その対応策としての特に効果の高い提案がある。
- A'：現場条件等を踏まえ提案された工法や施工手順等について、施工上及び維持管理上の課題が適切かつ論理的に整理されており、その対応策としての効果の高い提案がある。
- B：現場条件等を踏まえ提案された工法や施工手順等について、施工上及び維持管理上の課題が整理されており、その対応策としての効果の有効な提案がある。
- B'：現場条件等を踏まえ提案された工法や施工手順等について、施工上及び維持管理上の課題が記載されているが、その対応策としての内容が一般的である。
- C：現場条件等を踏まえ提案された工法や施工手順等について、施工上及び維持管理上の課題が記載されているが、その対応策としての内容が不明確である。
- ：現場条件等を踏まえ提案された工法や施工手順等について、施工上及び維持管理上の課題が記載されていない、または、その対応策としての内容が不適切である。

実現性

- A：実施事例や類似事例（事例は国内外を問わない。）の記述があり、当該施設の特殊性（代替施設が施設内にない、施設の長期的利用等）を踏まえた維持管理に関する内容となっており、資機材、作業船の調達等に提案に対する現実性が特に高いと認められる十分な裏付けがある。
- A'：実施事例や類似事例（事例は国内外を問わない。）の記述があり、当該施設の特殊性（代替施設が施設内にない、施設の長期的利用等）を踏まえた維持管理に関する内容となっており、資機材、作業船の調達等に提案に対する現実性が高いと認められる裏付けがある。
- B：実施事例や類似事例（事例は国内外を問わない。）の記述があり、当該施設の特殊性（代替施設が施設内にない、施設の長期的利用等）を踏まえた維持管理に関する内容となっており、資機材、作業船の調達等に提案に対する現実性が認められる裏付けがある。
- B'：実施事例や類似事例（事例は国内外を問わない。）の記述があり、当該施設の特殊性（代替施設が施設内にない、施設の長期的利用等）を踏まえた維持管理に関する内容となっているが、資機材、作業船の調達等に提案に対する現実性が認められない部分がある。
- C：実施事例や類似事例（事例は国内外を問わない。）の記述があり、当該施設の特殊性（代替施設が施設内にない、施設の長期的利用等）を踏まえた維持管理に関する内容となっているが、資機材、作業船の調達等に提案に対する現実性が認められない部分が多い。
- ：実施事例や類似事例（事例は国内外を問わない。）の記述があり、当該施設の特殊性（代替施設が施設内にない、施設の長期的利用等）を踏まえた維持管理に関する内容となっているが、資機材、作業船の調達等に提案に対する現実性が認められない。

(c)

的確性

- A：現場条件等や当該施設の特殊性（代替施設が施設内にない、施設の長期的利用等）を踏まえ提案された設計、工法又は施工手順等が、コスト抑制について適切かつ論理的に整理されており、その対応策としての特に効果の高い提案がある。
- A'：現場条件等や当該施設の特殊性（代替施設が施設内にない、施設の長期的利用等）を踏まえ提案された設計、工法又は施工手順等が、コスト抑制について適切かつ論理的に整理されており、その対応策としての効果の高い提案がある。
- B：現場条件等や当該施設の特殊性（代替施設が施設内にない、施設の長期的利用等）を踏まえ提案された設計、工法又は施工手順等が、コスト抑制について適切かつ論理的に整理されており、その対応策としての有効な提案がある。
- B'：現場条件等や当該施設の特殊性（代替施設が施設内にない、施設の長期的利用等）を踏まえ提案された設計、工法又は施工手順等が、コスト抑制について適切かつ論理的に整理されているが、その対応策としての提案が一般的である。
- C：現場条件等や当該施設の特殊性（代替施設が施設内にない、施設の長期的利用

等)を踏まえ提案された設計、工法又は施工手順等が、コスト抑制について適切かつ論理的に整理されているが、その対応策としての提案が不明確である。

- : 現場条件等や当該施設の特異性(代替施設が施設内にない、施設の長期的利用等)を踏まえ提案された設計、工法又は施工手順等が、コスト抑制について適切かつ論理的に整理されていない、または、その対応策としての提案が不適切である。

実現性

- A : 実施事例や類似事例(事例は国内外を問わない。)の記述があり、コスト抑制を意識した内容となっており、提案に対する現実性が特に高いと認められる十分な裏付けがある。
- A' : 実施事例や類似事例(事例は国内外を問わない。)の記述があり、コスト抑制を意識した内容となっており、提案に対する現実性が高いと認められる裏付けがある。
- B : 実施事例や類似事例(事例は国内外を問わない。)の記述があり、コスト抑制を意識した内容となっており、提案に対する現実性が認められる裏付けがある。
- B' : 実施事例や類似事例(事例は国内外を問わない。)の記述があり、コスト抑制を意識した内容となっているが、提案に対する現実性が認められない部分がある。
- C : 実施事例や類似事例(事例は国内外を問わない。)の記述があり、コスト抑制を意識した内容となっているが、提案に対する現実性が認められない部分が多い。
- : 実施事例や類似事例(事例は国内外を問わない。)の記述があり、コスト抑制を意識した内容となっているが、提案に対する現実性が認められない。

(d)

的確性

- A : 着眼点、施工上の課題が適切かつ論理的に整理されており、その対応策として、安全確保のための特に効果の高い提案がある。
- A' : 着眼点、施工上の課題が適切かつ論理的に整理されており、その対応策として、安全確保のための効果の高い提案がある。
- B : 着眼点、施工上の課題が整理されており、その対応策として、安全確保のための有効な提案がある。
- B' : 着眼点、施工上の課題が記載されているが、その対応策として安全確保のための提案内容が一般的である。
- C : 着眼点、施工上の課題が記載されているが、その対応策として安全確保のための提案内容が不明確である。
- : 着眼点、施工上の課題が記載されているが、その対応策として安全確保のための提案内容が不適切である。

実現性

- A : 実施事例や類似事例(事例は国内外を問わない。)の記述があり、提案に対する実現性が特に高いと認められる十分な裏付けがある。
- A' : 実施事例や類似事例(事例は国内外を問わない。)の記述があり、提案に対する実

現性が高いと認められる裏付けがある。

B：実施事例や類似事例（事例は国内外を問わない。）の記述があり、提案に対する実現性が認められる裏付けがある。

B'：実施事例や類似事例（事例は国内外を問わない。）の記述があるが、提案に対する実現性が認められない部分がある。

C：実施事例や類似事例（事例は国内外を問わない。）の記述があるが、提案に対する実現性が認められない部分が多い。

—：実施事例や類似事例（事例は国内外を問わない。）の記述がない、または、提案に対する実現性が認められない

5. 価格等交渉

（１）実施方法

発注者及び優先交渉権者で技術協力業務の契約を締結するに当たり、設計業務及び技術協力業務完了後の工事の契約に向けた価格等の交渉等に関する基本協定を令和６年８月２日に締結した。

（２）経過

基本協定書に基づき、３回の価格等交渉を実施した。主な経過は以下の通りである。

【第１回】令和７年１０月２０日

積算条件、積算数量、積算基準、積算単価、価格差の確認。

【第２回】令和７年１０月２４日

第１回での質疑事項の確認、見積項目の選別及び精査

【第３回】令和７年１０月２７日

第２回での質疑事項の確認、見積項目の最終精査

上記３回の価格等交渉を踏まえ、発注者において優先交渉権者の価格の妥当性を確認したことから、令和７年１０月３１日に学識経験者に価格等交渉結果について報告し、価格交渉結果及び交渉成立の妥当性が確認された。

（３）価格の妥当性の検証について

優先交渉権者から提出された工種毎における見積額の妥当性の検証については、以下のとおり行い、見積り条件やヒアリング等により妥当性を確認した。

① 歩掛については、原則、標準歩掛と著しく乖離していないことを確認した。

② 単価（労務単価、資材単価、機械経費）については、原則、物価誌等で公表している統一単価及び市場単価と著しく乖離していないを確認した。

③ 優先交渉権者の見積額については、積算基準等と著しく乖離していないこと、根拠として信頼性のある資料が確認でき、その内容の妥当性が認められるか確認した。

(4) その他

価格等交渉の過程で決定した施工条件等については、特記仕様書に記載し契約に反映させた。

(5) 見積合せ

実施日時 令和7年11月25日

6. 契約相手方の決定

(1) 工事名：築城(7)施設最適化工事（技術協力業務対象工事（その1））

(2) 契約者：築城(6)施設最適化総合設計に係る技術協力業務対象工事 大林組・若築建設・大本組・九鉄工業・松山建設・瀬口組 最適化事業建設共同企業体

(3) 工事場所：航空自衛隊築城基地内

(4) 工事請負契約締結日：令和7年12月5日

(5) 契約金額：

予定価格 1,031,550,285 円（消費税及び地方消費税を含む）

契約金額 1,025,860,000 円（消費税及び地方消費税を含む）

7. 技術提案・交渉方式に係る専門部会の経緯

本工事の手続きにあたっては、中立かつ公正な審査を行うため、学識経験者に、全4回の意見聴取を行った。

各委員会の開催日及び意見聴取事項等は以下のとおり。

【第1回意見聴取 公示前】

1) 開催日：令和6年1月26日（金）～同年2月8日（木）

2) 意見聴取事項

① 技術提案・交渉方式の適用の可否について。

3) 主な意見

① 技術提案・交渉方式を適用することは、妥当性がある。

【第2回意見聴取 公示前】

1) 開催日：令和6年3月1日（金）～同年3月7日（木）

2) 意見聴取事項

① 技術提案範囲・項目・評価基準について。

② 参考額の設定方法について。

③ 交渉手続について。

3) 主な意見

① 技術提案範囲・項目・評価基準について、妥当性がある。

② 参考額の設定方法について、妥当性がある。

③ 参考額の設定を含めた価格等の交渉の実施に係る事項、交渉結果の公表事項について、妥当性がある。

【第3回意見聴取 技術審査段階】

1) 開催日：令和6年6月20日(木)～同年6月21日(金)

2) 意見聴取事項

- ① 競争参加者の技術提案内容について。
- ② 個別評価項目の技術審査・評価内容について。
- ③ 競争参加者の技術評価点について。
- ④ 技術提案に対する講評について。
- ⑤ 優先交渉権者選定、交渉権者選定及び非選定について。

3) 主な意見

- ① 技術提案内容について、成立性・妥当性がある。
- ② 技術提案の個別評価項目に対する審査及び評価結果について、妥当性がある。
- ③ 技術評価点について、妥当性がある。
- ④ 技術提案に係わる競争参加者全般にわたる総合講評及び各競争参加者に対する個別講評について、妥当性がある。
- ⑤ 非選定とする理由等について、妥当性がある。

【第4回意見聴取 価格等の交渉段階】

1) 開催日：令和7年10月31日(金)

2) 意見聴取事項

- ① 価格の妥当性の検証について
- ② 交渉結果の公表について。

3) 主な意見

- ① 価格の妥当性の検証について、妥当性がある。
- ② 交渉結果の公表について、妥当性がある。
